

特殊料件

訂單號碼	0641 33A-0337-0001	供應商	☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: <u>王派</u>	
品 名	馬達固定牆	進料日期	2025 年 10 月 27 日	機種分類: ☒ 1. ZAPAK: <u>93</u> ☐ 2. OEM: _____ ☐ 3. 其他: _____
料 號	93XXAB1/H	檢驗日期	2025 年 10 月 27 日	
材 質	ADC12/T5	進料數	1000 pcs	

NG OK

判定: ☐合格, ☐特採, ☒拒收.

• Z'#4 NOGO NG，使用 Ø4.04mm 塞規可過，以游標卡尺量測數值為 4.95~4.99mm，有橢圓孔現象，實配定位柱也無緊度。

1.檢驗完成後,務必將被測物料之進料檢驗判定,明顯的標示清楚以供識別

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告

NO.: Q25102714(2/4)

訂單號碼		同首頁		供應商		☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 王派							
品 名		馬達固定牆		進料日期		2025 年 10 月 27 日		機種分類:					
料 號		93XXAB1/H		檢驗日期		2025 年 10 月 27 日		☒ 1. ZAPAK: 93 ☐ 2. OEM: _____ ☐ 3. 其他: _____					
材 質		ADC12/T5		進料數		1000 pcs							




檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
R	2-M3xP0.5 深 10MM		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
S	4.50		4.483	4.517	4.464	4.468	4.489	4.500	4.532	4.476	4.492	4.462	T11	OK
T	2-M2xP0.4 貫穿		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
U	2-M2xP0.4 深 5MM		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
V	4.00		4.029	4.032	3.962	4.030	3.986	4.031	4.001	3.989	4.011	4.019	T11	OK
W	37.85		37.832	37.819	37.851	37.804	37.841	37.842	37.844	37.838	37.848	37.813	T11	OK
X	50.40		50.247	20.241	50.238	50.222	50.219	50.123	50.153	50.184	50.219	50.174	T11	NG
Y	52.10		52.126	52.107	52.110	52.064	52.099	52.150	52.098	52.142	52.138	52.123	T11	OK
Z	18.00		--											
A'	15.88		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
B'	Ø15.00+0.01/+0.03		OK	OK	OK	NG	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5/T12	NG
C'	R13.5 +0.1/0		13.533	13.546	13.547	13.508	13.528	13.520	13.537	13.530	13.538	13.560	T11	OK
D'	2-M4xP0.7 貫穿		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
E'	33.38		33.33	33.35	33.33	33.34	33.33	33.34	33.33	33.34	33.33	33.33	T6/T12	OK
F'	22.38		22.33	22.41	22.33	22.36	22.40	22.41	22.43	22.43	22.43	22.39	T6/T12	OK
G'	47.10		47.07	47.05	47.05	47.05	47.06	47.05	47.05	47.05	47.05	47.05	T6/T12	OK
H'	2-R2.0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
I'	72.10		72.00	71.95	72.00	71.96	72.06	72.03	72.06	72.03	72.02	72.03	T6/T12	NG
J'	70.10		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
K'	47.60		--											
L'	101.41		101.009	100.600	100.734	100.511	100.596	100.658	100.669	100.811	100.487	100.951	T11	NG
M'	87.91		87.645	87.775	87.849	87.801	87.517	87.846	87.801	87.734	87.575	87.665	T11	NG
N'	60.26		60.283	60.299	60.303	60.309	60.298	60.301	60.259	60.298	60.308	60.310	T11	OK
O'	Ø8.0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T10	OK
P'	Ø5.4		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
Q'	2- Ø 5.4		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
R'	4.00		4.00	3.99	4.05	4.02	4.02	4.04	4.04	4.01	4.04	4.04	T1	OK
S'	C2		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T10	OK
T'	32.00		32.011	32.023	32.004	31.998	31.988	31.991	31.994	32.014	31.979	32.000	T11	OK

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告

NO.:Q25102714(3/4)

訂單號碼		同首頁		供應商		☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 王派							
品 名		馬達固定牆		進料日期		2025 年 10 月 27 日				機種分類:			
料 號		93XXAB1/H		檢驗日期		2025 年 10 月 27 日				☒ 1. ZAPAK: 93 ☐ 2. OEM: _____ ☐ 3. 其他: _____			
材 質		ADC12/T5		進料數		1000 pcs							

檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
U'	7.50		7.522	7.481	7.525	7.548	7.504	7.546	7.514	7.529	7.531	7.546	T11	OK
V'	11.11±0.02		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
W'	54.76		54.776	54.806	54.710	54.797	54.793	54.799	54.787	54.801	54.725	54.799	T11	OK
X'	90.91		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
Y'	5°		4.963	4.981	5.020	5.123	5.005	5.018	4.969	4.978	5.164	5.088	T11	OK
A''	28.60±0.02		28.581	28.584	28.586	28.581	28.585	28.586	28.583	28.585	28.582	28.588	T11	OK
B''	29.15		29.07 29.15	29.12 29.19	29.14 29.19	29.10 29.17	29.16 29.20	29.17 29.22	29.10 29.15	29.14 29.17	29.05 29.07	29.13 29.17	T1	NG
C''	2-R5.0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
D''	Ø6.5		6.42	6.42	6.44	6.44	6.42	6.42	6.42	6.42	6.41	6.44	T1	OK
E''	3.5		3.48	3.58	3.58	3.57	3.62	3.61	3.56	3.60	3.51	3.59	T1	NG
F''	5.85		5.91	5.99	5.97	5.96	6.00	6.04	5.94	5.97	5.93	5.98	T6	NG
G''	Ø5.98		5.92	5.94	5.94	5.94	5.93	5.92	5.91	5.93	5.90	5.92	T1	NG
H''	2.15		2.34	2.43	2.37	2.42	2.40	2.42	2.30	2.36	2.36	2.36	T1	NG
I''	5.85		5.98	6.05	6.01	6.04	6.02	6.03	5.98	6.01	5.94	6.02	T1	NG
J''	18.40		18.59	18.59	18.57	18.57	18.59	18.58	18.59	18.59	18.57	18.59	T1	NG
K''	4- Ø3.20		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
L''	Ø53.00±0.03PCD		53.015	52.971	53.022	52.992	53.013	53.018	52.998	52.994	52.974	52.979	T11	OK
N''	Ø38.0		37.99	38.00	38.01	37.99	37.99	37.99	38.01	38.01	38.00	38.01	T1	OK
O''	Ø32.00/-0.02		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
P''	10.6+0.1/-0		10.62	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63	10.63	10.64	10.64	10.63	T6	OK
Q''	12.1		12.11	12.12	12.10	12.10	12.10	12.10	12.14	12.13	12.09	12.12	T1	OK
R''	6.25		6.04	6.04	6.04	6.01	6.03	6.05	6.04	6.03	6.03	6.04	T6	NG
S''	3.6		3.56	3.58	3.59	3.59	3.59	3.59	3.58	3.59	3.58	3.58	T6	OK
T''	Ø29.0 -0.02/0		28.99	28.98	28.99	28.99	28.99	28.99	28.99	28.99	28.99	28.99	T1	OK
U''	56.03		--											
V''	C1.5		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
W''	C0.5		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
X''	C0.5		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK

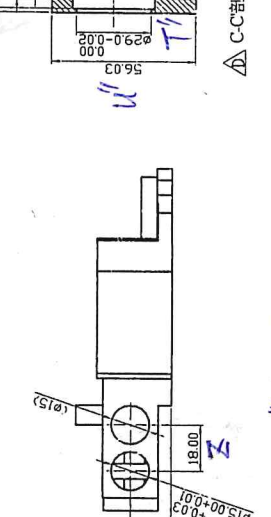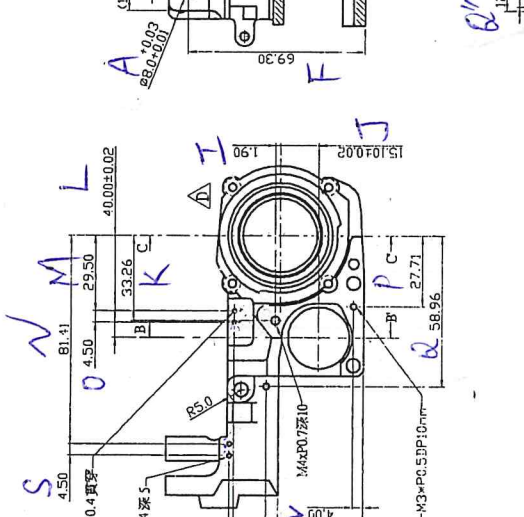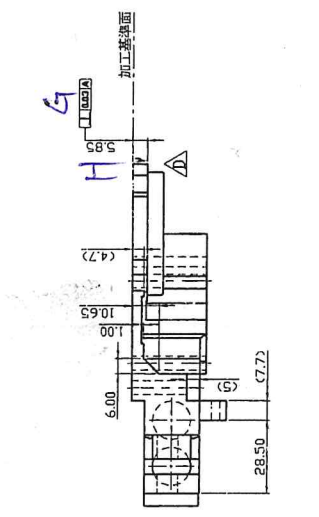

而圓孔不得有任何干涉和碰撞

D'''项 → 加酸 M = 2 倍 L
以 0.70mm 显微镜
测试 100 倍
(双头测试)

[illegible]

PLEASE DON'T MEASURE THE DIMENSION OF THE DRAWING
