

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告

NO.:Q26042703(1/4)

訂單號碼	34A-0074 33A-0076-0002 59A-0027 52C-0004	供應商	☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 王派	
品名	馬達固定牆	進料日期	2026 年 04 月 27 日	機種分類:
品號	93XXAB1/H	檢驗日期	2026 年 04 月 27 日	☒ 1. ZAPAK: 93
材質	ADC12/T5	進料數	535+76=611 pcs	☐ 2. OEM: _____
				☐ 3. 其他: _____

檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
A	Ø8.0 +0.01/+0.03		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
B	14.38		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
C	Ø21.00 -0.02/0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
D	1.50		1.53	1.51	1.55	1.55	1.53	1.54	1.55	1.53	1.55	1.51	T6	OK
E	Ø24.00 -0.02/0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
F	69.30		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
G	±0.03/A		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T6	OK
H	5.85		6.04	6.04	5.97	6.06	6.05	6.03	6.09	6.07	6.08	5.94	T1	NG
I	1.90		1.943	1.876	1.861	1.913	1.947	1.935	1.913	1.938	1.919	1.913	T11	OK
J	15.10±0.02		15.081	15.106	15.110	15.115	15.113	15.104	15.081	15.112	15.090	15.014	T11	OK
K	33.26		33.308	33.277	33.304	33.304	33.305	33.307	33.309	33.290	33.307	33.302	T11	OK
L	40.00±0.02		39.994	39.983	39.993	40.020	40.016	40.012	40.004	39.982	40.018	40.013	T11	OK
M	29.50		29.496	29.501	29.485	29.529	29.520	29.489	29.525	29.494	29.499	29.539	T11	OK
O	4.50		4.502	4.497	4.498	4.498	4.501	4.502	4.502	4.508	4.490	5.513	T11	OK
P	27.71		27.690	27.699	27.695	27.684	27.690	27.698	27.719	27.728	27.694	27.714	T11	OK
Q	58.96		58.971	58.980	58.935	58.969	58.986	58.996	58.999	58.950	59.007	58.986	T11	OK

檢驗水準:	T1	游標卡尺	T2	分厘卡	T3	厚薄規	T4	檢具
☒ MIL-STD-105E 表 AQL S-4, 0.25% ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	T5	塞規	T6	高度規	T7	表面粗糙儀	T8	硬度計
☐ 全檢. ☒ 小量抽檢: ☐ 5, ☒ 10, ☐ 30, ☐ 其他 _____ pcs	T9	2.5 次元	T10	投影機	T11	影像量測儀	T12	其他
檢驗數: ☒ 20PCS 不良數: 2 PCS 不良率: 90% ☒ 20PCS 不良數: 0 PCS 不良率: 0% ☒ 20PCS 不良數: 0 PCS 不良率: 0% ☒ 20PCS 不良數: 0 PCS 不良率: 0% ☒ 20PCS 不良數: 12 PCS 不良率: 60%	判定: ☒ 合格. ☐ 特採. ☒ 拒收. 原拒收但因急料, 緊急由王派廠處理, 複檢合格 05.40 最後加工批! 100% 26							

備註: 檢驗時間: 10:00~17:30、04/28-09:30~10:30 共 450 分
本批 H、X、B'、I'、L'、M'、B''、F''、G''、H''、I''、J''、M''、R''、C''' 共 15 項 NG, 其中 C''' 項為毛邊未清除*2PCS(毛邊位置於鎖附馬達齒輪固定座上螺孔邊緣), B'、M'' 項實配皆 OK, 其餘 12 項 NG 同前。
已提醒多次, 請速回處理!
因有收 459 日王派已派員至廠內重工毛頭, 驗重工毛頭後, IOL 後再檢 OK F.T.S.

審核	檢驗
Lee 04/28/26	3/26 04/28/26

1. 檢驗完成後, 務必將被測物料之進料檢驗判定, 明顯的標示清楚以供識別
王派 04/30/26

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告

NO.: Q26042703 (2/4)

訂單號碼		同首頁		供應商		☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 王派							
品 名		馬達固定牆		進料日期		2026 年 04 月 27 日		機種分類:					
品 號		93XXAB1/H		檢驗日期		2026 年 04 月 27 日		☒ 1. ZAPAK: 93 _____ ☐ 2. OEM: _____ ☐ 3. 其他: _____					
材 質		ADC12/T5		進料數		535+76=611 pcs							






檢項	尺寸 規格值	NO.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	測定器	判定
R	2-M3×P0.5 深 10MM		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
S	4.50		4.456	4.482	4.509	4.521	4.504	4.490	4.483	4.499	4.485	4.481	T11	OK
T	2-M2×P0.4 貫穿		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
U	2-M2×P0.4 深 5MM		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
V	4.00		3.964	4.010	4.047	4.040	4.049	4.048	4.002	3.957	3.960	3.977	T11	OK
W	37.85		37.851	37.807	37.809	37.822	37.819	37.813	37.846	37.803	37.809	37.823	T11	OK
X	50.40		50.194	50.209	50.183	50.201	50.164	50.189	50.228	50.189	50.210	50.197	T11	NG
Y	52.10		52.136	52.122	52.066	52.071	52.145	52.088	52.112	52.059	52.084	52.091	T11	OK
Z	18.00		--											
A'	15.88		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
B'	Ø15.00+0.01/+0.03		OK	OK	GONG	GONG	GONG	OK	GONG	GONG	OK	GONG	T5/T12	NG
C'	R13.5 +0.1/0		13.552	13.560	13.517	13.584	13.562	13.531	13.547	13.519	13.550	13.577	T11	OK
D'	2-M4×P0.7 貫穿		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
E'	33.38		33.33	33.36	33.39	33.35	33.34	33.41	33.41	33.35	33.37	33.40	T6/T12	OK
F'	22.38		22.42	22.35	22.43	22.35	22.33	22.34	22.36	22.34	22.35	22.37	T6/T12	OK
G'	47.10		47.06	47.09	47.06	47.06	47.05	47.07	47.15	47.06	47.08	47.06	T6/T12	OK
H'	2-R2.0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
I'	72.10		72.10	72.12	72.02	72.10	72.05	72.05	72.07	72.15	72.12	72.08	T6/T12	NG
J'	70.10		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
K'	47.60		--											
L'	101.41		100.556	100.597	100.606	100.661	100.519	100.741	100.558	100.520	100.707	100.470	T11	NG
M'	87.91		87.456	87.283	87.462	87.363	87.520	87.345	87.453	87.027	87.356	87.491	T11	NG
N'	60.26		60.302	60.238	60.259	60.277	60.241	60.290	60.289	60.275	60.227	60.283	T11	OK
O'	Ø8.0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T10	OK
P'	Ø5.4		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
Q'	2- Ø 5.4		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
R'	4.00		4.03	4.01	4.03	4.04	4.03	4.03	3.99	4.02	4.05	4.04	T1	OK
S'	C2		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T10	OK
T'	32.00		31.971	31.976	31.960	31.988	32.020	31.977	31.976	31.964	31.988	32.040	T11	OK

泛源股份有限公司
PANTECH INTERNATIONAL
進料檢驗報告

NO.:Q26042703 (3/4)

訂單號碼	同首頁	供應商	☐ 客戶: _____ ☒ 供應商: 王派										
品 名	馬達固定牆	進料日期	2026 年 04 月 27 日				機種分類:						
品 號	93XXAB1/H	檢驗日期	2026 年 04 月 27 日				☒ 1. ZAPAK: 93 ☐ 2. OEM: _____ ☐ 3. 其他: _____						
材 質	ADC12/T5	進料數	535+76=611 pcs										

檢項	尺寸 規格值	NO.											測定器	判定
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
U'	7.50		7.526	7.512	7.536	7.529	7.545	7.522	7.521	7.517	7.501	7.506	T11	OK
V'	11.11±0.02		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
W'	54.76		54.757	57.741	54.713	54.715	54.755	54.781	54.723	54.730	54.749	54.763	T11	OK
X'	90.91		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T4	OK
Y'	5°		5.179	4.933	5.183	4.956	4.744	5.104	4.812	4.771	4.542	5.089	T11	OK
A''	28.60±0.02		28.587	28.586	28.581	28.592	28.594	28.589	28.615	28.581	28.584	28.592	T11	OK
B''	29.15		29.12 29.18	29.16 29.19	29.10 29.11	29.13 29.19	29.12 29.19	29.16 29.18	29.12 29.15	29.13 29.20	29.16 29.20	29.05 29.10	T1	NG ok
C''	2-R5.0		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
D''	Ø6.5		6.41	6.43	6.42	6.42	6.42	6.42	6.43	6.42	6.42	6.41	T1	OK
E''	3.5		3.59	3.48	3.49	3.49	3.56	3.45	3.50	3.57	3.56	3.46	T1	OK
F''	5.85		6.00	5.93	5.86	5.95	5.94	5.93	5.90	5.96	5.95	5.82	T6	NG
G''	Ø5.98		5.88	5.88	5.88	5.88	5.89	5.90	5.90	5.89	5.90	5.86	T1	NG
H''	2.15		2.43	2.28	2.09	2.28	2.23	2.20	2.36	2.34	2.30	2.06	T1	NG ok
I''	5.85		6.08	6.01	5.92	6.01	5.92	5.98	6.04	6.03	6.00	5.81	T1	NG
J''	18.40		18.58	18.55	18.58	18.56	18.56	18.56	18.57	18.56	18.55	18.56	T1	NG
K''	4- Ø3.20		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
L''	Ø53.00±0.03PCD		52.971	52.988	52.985	52.987	52.985	52.988	52.983	52.988	52.982	52.992	T11	OK
N''	Ø38.0		38.00	38.00	38.03	38.00	38.00	38.01	38.01	38.00	38.00	38.01	T1	OK
O''	Ø32.00/-0.02		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T5	OK
P''	10.6+0.1/-0		10.62	10.64	10.64	10.65	10.63	10.62	10.63	10.64	10.63	10.63	T6	OK
Q''	12.1		12.10	12.13	12.13	12.14	12.08	12.13	12.14	12.13	12.18	12.14	T1	OK
R''	6.25		6.03	6.08	6.18	6.08	6.06	6.10	6.03	6.07	6.09	6.22	T6	NG ok
S''	3.6		3.58	3.59	3.59	3.60	3.60	3.57	3.59	3.59	3.60	3.62	T6	OK
T''	Ø29.0 -0.02/0		28.99	28.99	28.99	28.99	28.99	28.99	29.00	28.99	28.99	28.99	T1	OK
U''	56.03		--											
V''	C1.5		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
W''	C0.5		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK
X''	C0.5		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	T12	OK

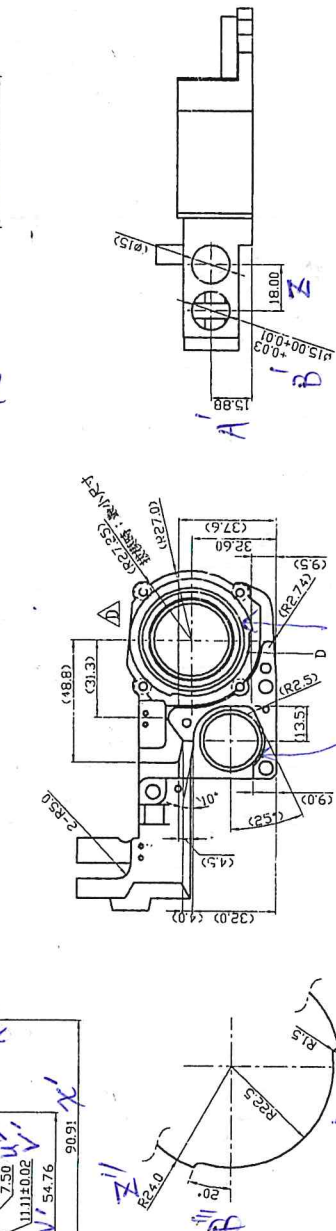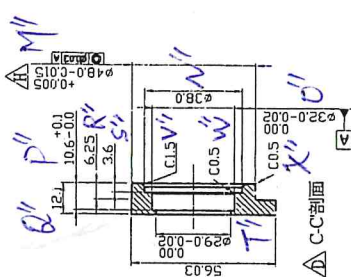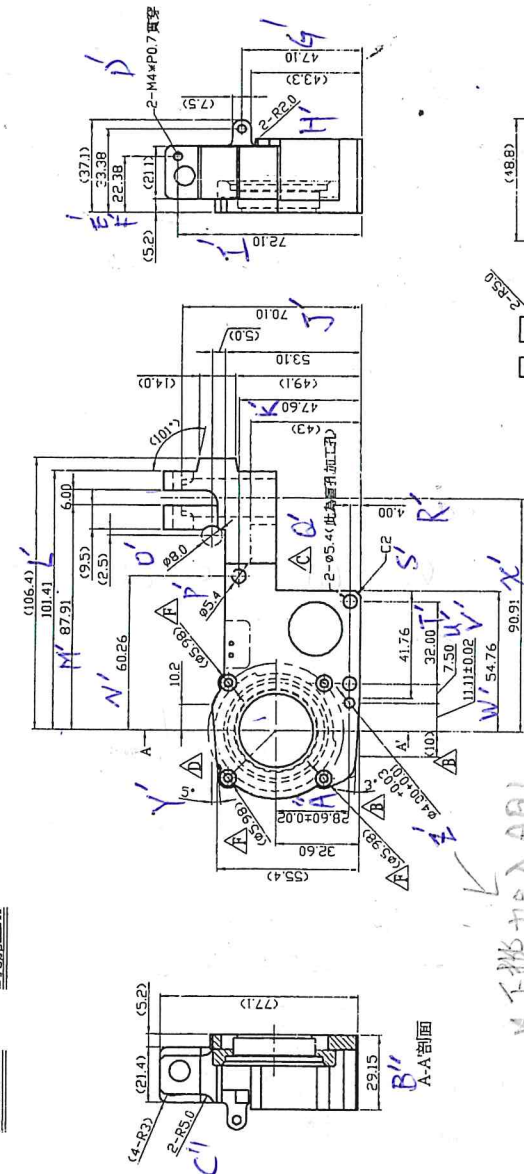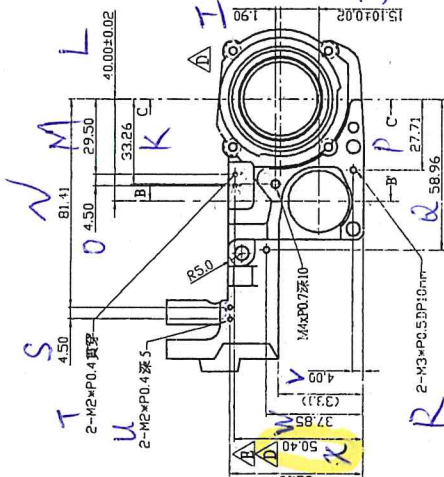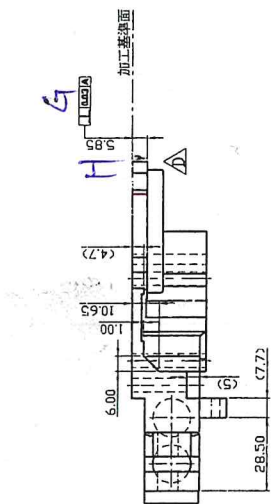

1. 素材：壓鑄
2. 工序：銑、鑽
3. 重量：145 g

"C" = 外觀 (白濁)

γ'' = 兩圓孔不得有任何干涉和碰撞

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLEASE DON'T MEASURE THE DIMENSION OF THE DRAWING

[illegible]

D"项 → 加载 M = 2 吨
以 $\phi 170\text{mm}$ 高钢
测钢绳 ~ 60
(双头测试)
